

宇部市

橋梁長寿命化修繕計画



令和5年3月



宇部市
UBE CITY

第1章 長寿命化修繕計画策定の背景・目的

1.1 背景

- 宇部市は、人口 164,095 人（2020 年 2 月 1 日現在）であり、2004（平成 16）年に旧宇部市と厚狭郡楠町とが合併し新しい宇部市が誕生しました。石炭産業を中心とした工場が多数あります。
- 本市は、山口県の西部に位置しており、周防灘（瀬戸内海）に面しています。そのため、沿岸では季節風の影響を受け飛来塩分による塩害環境下にあります。
- 本市は、橋長 15m以上の橋梁 89 橋、15m未満の橋梁 343 橋、全 432 橋を管理しています。
- 1960 年代～1980 年代にかけて建設された橋梁が多く、今後これらの橋梁が補修・補強又は架替えの時期を迎えることが考えられます。
- 現在（2019 年度）、建設後 50 年以上を経過する高齢化橋梁は 119 橋（28%）で、今後 20 年後には 350 橋（83%）となり、橋梁の高齢化が急速に進展することになります。（図-1.1）
- そこで、今後増大が見込まれる橋梁の維持管理に要するコストの縮減を図るために、従来の事後保全型から予防保全型の維持管理への転換を図る必要があります。




図-1.1 宇部市における橋梁の高齢化の推移

1.2 目的

前述した宇部市管理橋梁の背景と後述する点検結果による損傷状況を踏まえ、長寿命化修繕計画の目的を以下のとおり設定しました。

- **道路ネットワークの安全性・信頼性の確保**
前述のとおり、50 年以上経過した橋梁が多く存在するとともに、瀬戸内海沿岸は塩害環境下にあります。そのような橋梁を市民の皆さんに安心・安全に利用していただけるように努めます。
- **維持管理コストの縮減、平準化**
限りある財源で安心・安全を確保できる維持管理を行っていく必要があります。そのためには予防保全型維持管理への早期転換を図り、コストの縮減と平準化を目指します。

1.3 基本方針

- 中長期ビジョンとして、50年間の長寿命化修繕計画を考案します。
- 短期ビジョンとして、10年間の事業計画を策定します。
- 予防保全型の維持管理への早期転換を図るため、早期対策が必要なⅢ判定以上の橋梁に主軸を置いた事業計画とします。(図-1.2)
- 並行的に、諸元重要度の高いⅡ判定の橋梁に対しては予防保全型維持管理を実施していきます。
- 従来は橋梁単位での補修工事が主流でしたが、Ⅲ判定橋梁数の改善(Ⅱ以上への措置実施)効率を高めるために、部材単位での工事発注形態へ移行します。
- 実現可能な事業計画を策定することにより、計画的な補修措置の実施、補修予算の平準化およびライフサイクルコスト(以下、LCC)の縮減を実現していきます。
- PDCA サイクルによるデータ蓄積結果をもとに長寿命化修繕計画を見直し、計画内容の高度化とさらなるLCCの縮減を図ります。
- 補修対策は、橋の損傷状況、重要度および予算を勘案した優先順位づけを行い、その結果をもとに計画的に実施していきます。

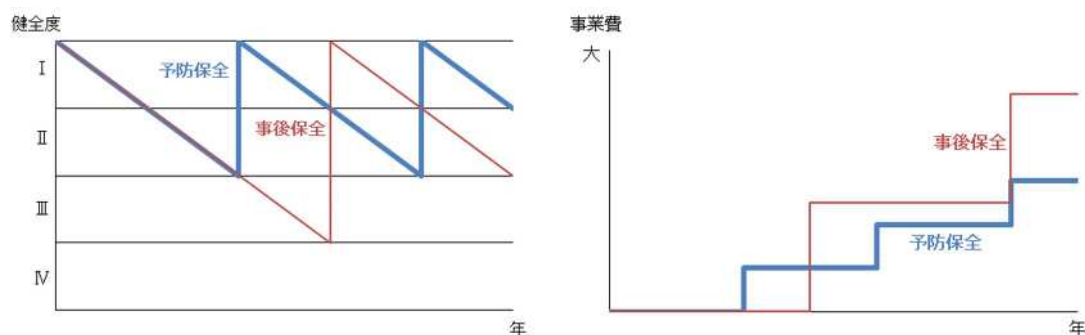


図-1.2 LCC (ライフサイクルコスト) 最小化のイメージ

第2章 宇部市管理橋梁の状況および一巡目点検結果の総括

2.1 管理橋梁の状況

宇部市が管理する橋梁には、以下の3つの特徴があります。

- RC橋（鉄筋コンクリート橋）が218橋で全体の50%（図-2.1）
- 橋長5m未満の小規模橋梁が200橋で全体の46%（図-2.2）
- 建設後50年を経過した橋が119橋で全体の28%（図-2.4）

(1) 橋種別の橋梁数

- 全管理橋梁においては、図-2.1に示すとおりRC橋が最も多く50%、次にPC橋が24%、次いでボックスカルバートが14%、鋼橋が7%、混合橋が3%、石橋が2%となっています。

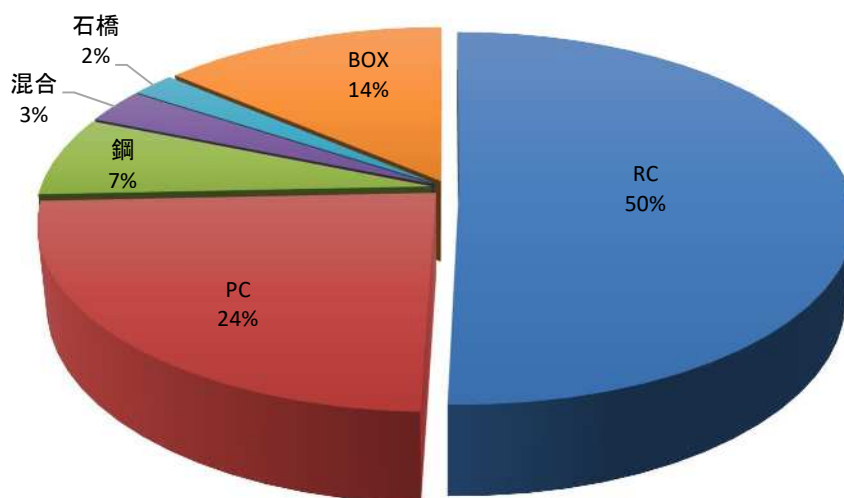


図-2.1 橋種別橋梁数の割合

(2) 橋長ごとの橋梁数

- 橋長ごとの橋梁数は、**図-2.2** と **図-2.3** に示すとおり橋長 15m以上が 89 橋で全体の 21%、橋長 15m未満が 343 橋で全体の 79%を占めています。しかし橋長ごとの橋面積では、橋長 15m 以上が 27780m²で全体の 71%、橋長 15 m未満が 11461m²で全体の 29%を占めています。
- 橋長 15m以上の橋梁においては PC 橋が 50 橋で最も多く全体の 56%、橋長 15m未満の橋梁においては RC 橋が 200 橋で最も多く全体の 58%を占めています。

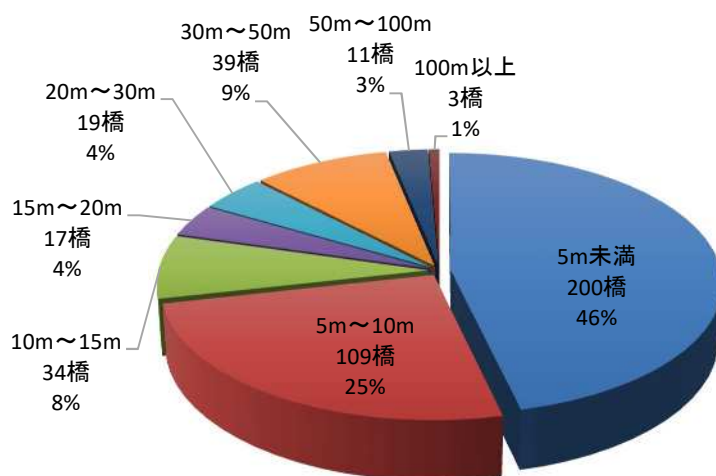


図-2.2 橋長ごとの橋梁数

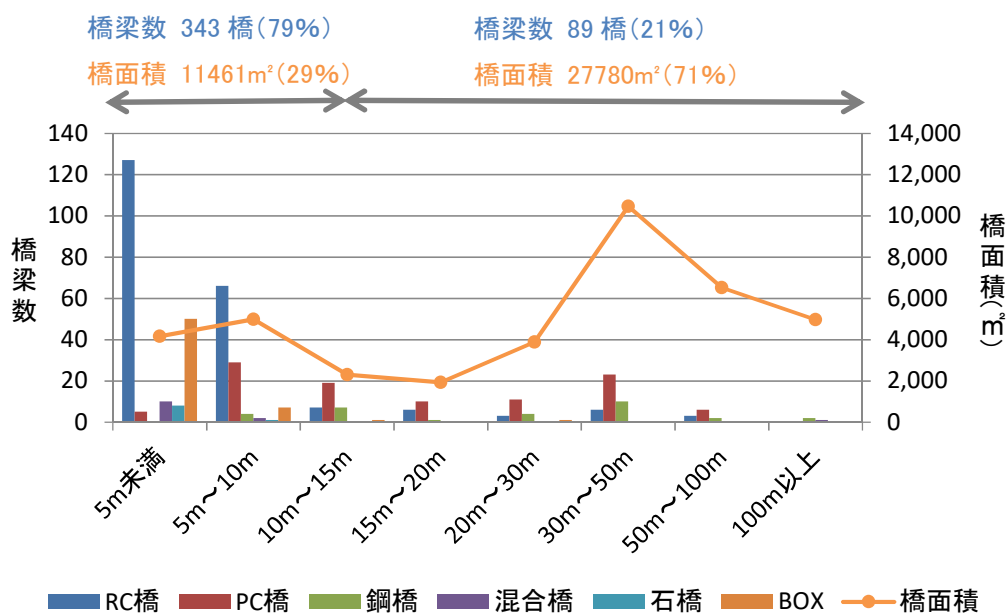


図-2.3 橋長・橋種ごとの橋梁数及び橋面積

(3) 架設年別の橋梁数

- 架設年別の橋梁数は図-2.4 に示すとおり戦後に多くの橋梁が建設され、1970年～1979年の間に149橋と最も多く建設されており全体の35%を占めています。
- 現時点（2019年度）で建設後50年を経過した橋梁数は、全体の28%（119橋）を占めており、10年後には全体の63%（268橋）、20年後には全体の83%（350橋）に達し、急速に高齢化橋梁の割合が増大することになります。

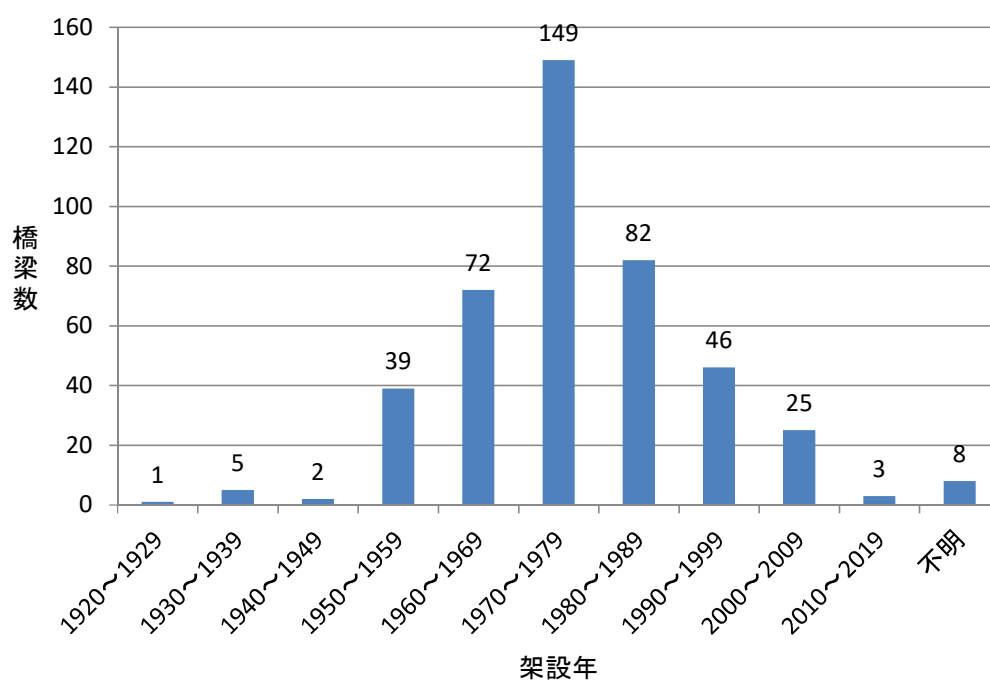


図-2.4 架設年別の橋梁数

2.2 管理橋梁の代表例

宇部市が管理する橋梁のうち、代表的な 3 橋を以下に列挙します。

宮川橋 橋梁形式：RC 橋 橋長：9.0m 架設年：1955 年



蛇瀬橋 橋梁形式：PC 橋 橋長：85.0m 架設年：1976 年



新東割橋 橋梁形式：PC 橋 橋長：32.7m 架設年：1995 年



写真-2.1 宇部市の代表的な橋梁

2.3 点検結果からの損傷状況

(1) 点検結果の判定方法

- 橋梁点検結果は、「山口県橋梁点検要領（案）」に沿って診断が行われており、部材ごとの損傷区分および健全性の診断結果は点検調書に取りまとめている。
- 健全性の診断区分の定義は、「Ⅰ：健全」、「Ⅱ：予防保全段階」、「Ⅲ：早期措置段階」、「Ⅳ：緊急措置段階」に区分しています。

(2) 健全性診断による評価分布

宇部市の全管理橋梁に対する健全性比率を図-2.5 に示します。

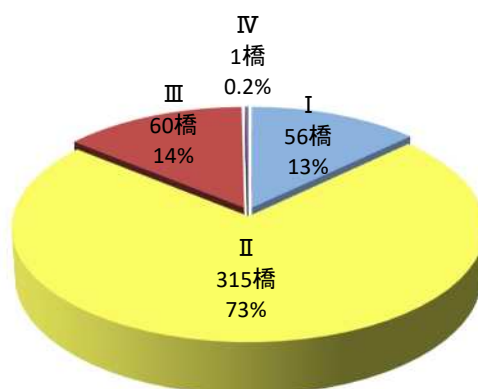


図-2.5 管理橋梁の健全性比率 (2019年4月時点)

表-2.1 健全性評価区分

区 分		定 義
Ⅰ	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

2.4 長寿命化修繕計画の対象橋梁

- 橋梁長寿命化修繕計画の対象となる橋梁は、宇部市が管理する橋梁全 432 橋です。
- このうち、補修措置を講じるための事業計画を策定する橋梁は 121 橋です。この 121 橋の選定内訳は、下記のとおりです。
 - ① 1 巡目点検（2014 年度～2018 年度）において、健全性が「Ⅲ」判定以上の橋梁（60 橋）
 - ② 健全性が「Ⅱ」判定以下であっても橋長が 15m 以上の橋梁（61 橋）

第3章 長寿命化修繕計画（点検・診断）

3.1 点検

（1）点検の目的

- 橋梁の損傷状態の把握、緊急に補修する必要がある箇所の早期発見
- 橋梁の計画的な維持管理および補修・補強を行うための基礎データ収集

橋梁点検は、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止、および橋梁の適切な維持管理のために必要な情報を得ることを目的に実施します。

通常点検により、損傷状況の把握、対策区分の判定、および点検結果の記録を行い、今後の維持管理の基礎資料を蓄積していきます。

（2）点検の基本的な方針

- 橋梁の定期点検は、損傷状態を把握し今後の維持管理の基礎資料を蓄積すると共に、橋梁の重大な損傷を早期に発見するために実施します。
- 橋梁の定期点検は、山口県の点検調書を用いて5年に1度実施します。

（3）点検対象橋梁

- 管理橋梁432橋に対して、点検を計画的に実施します。
- 2023（令和5）年度までに2巡目の点検を終了させます。

3.2 診断

- 点検結果を踏まえ、I～IVの4段階評価による診断を実施し健全性を評価します。

第4章 長寿命化修繕計画（措置）

4.1 優先順位の検討

4.1.1 諸元重要度評価点

諸元重要度では、宇部市の地域性を色濃く反映した下記の評価要素を取り入れています。

①路線特性

市道の道路等級及び交通量が多い路線について重要視した評価を行います。

②災害特性

災害時における橋梁の重要性を評価するために、幹線(国道又は県道)から避難所へのアクセス道路上に存在する橋梁を重要視しています。

③行政政策特性

人口減少や少子高齢化の進行などの課題に対応するために立案された「宇部市立地適正化計画」を考慮します。

上記事項に加えて、前回の計画策定時に考慮した「路下条件」および「路線重要度」を評価事項として諸元重要度の評価を行います。(表-4.1)

表-4.1 評点および重み係数

地域特性	種別	細別	重み係数	評価条件	評点	評価点
路線特性 (0.200)	道路等級	-	0.100	1級路線	100	10.0
				2級路線	50	5.0
				その他路線	0	0.0
	舗装設計重要度区分	-	0.100	C交通 (N6)	100	10.0
				B交通 (N5)	50	5.0
				上記以外	0	0.0
災害特性 (0.200)	避難所へのアクセス道	-	0.200	該当あり	100	20.0
				該当なし	0	0.0
行政政策特性 (0.100)	立地適正化計画	-	0.100	都市機能誘導区域 (まちなかエリア)	100	10.0
				居住誘導区域① (暮らしの重点エリア)	80	8.0
				居住誘導区域② (暮らしのおすすめエリア)	60	6.0
				用途区域	40	4.0
				上記以外	0	0.0
				路下条件	-	0.150
高規格道路	80	12.0				
一般道	60	9.0				
歩道・駐車場など	40	6.0				
上記以外	0	0.0				
路費要素 (0.500)	緊急輸送道路	-	0.150	一次緊急		
				二次・三次緊急	50	7.5
				その他	0	0.0
	DID地区	-	0.025	該当あり	100	2.5
				該当なし	0	0.0
	バス路線	-	0.050	該当あり	100	5.0
				該当なし	0	0.0
	迂回路の有無	-	0.100	なし	100	10.0
				あり	0	0.0
	大型車対応路線	-	0.025	該当あり	100	2.5
該当なし				0	0.0	

4.1.2 部材健全度評価点

部材の健全度は、定期点検により得られた損傷区分に応じた現時点での部材の損傷程度、損傷部位の重みによって計算します。部材健全度評価点は、健全度評価点(表-4.2)および各部材の重み係数(表-4.3)によって設定します。また、ここでの重み係数は耐荷性を採用することとします。

また、同じⅢ判定であっても変状割合に程度の幅を有しているため、Ⅲ判定橋梁に対して細分化判定を実施しました。細分化項目は以下に示すとおりです。

表-4.2 健全度評価点

健全度		評点
E	Ⅳ	80
D	Ⅲ+	60
C	Ⅲ	40
B	Ⅱ	20
A	Ⅰ	0

- Ⅲ+：Ⅳに近いⅢ判定
- Ⅲ：Ⅱに近いⅢ判定

表-4.3 各部材の重み係数

部材種別	重み係数		
	耐荷性	災害抵抗性	走行安全性
主桁	1.0	0.4	0.2
床版	0.6	0.2	1.0
横桁	0.2	0.2	0.0
対傾構	0.2	0.2	0.0
横構	0.2	0.2	0.0
下部工	0.2	1.0	0.0
支承	0.2	0.8	0.2
伸縮装置	0.0	0.0	0.8

出典：国総研資料 第776号「平成24年度道路構造物に関する基本データ集」p.76より抜粋

4.1.3 総合評価

長寿命化修繕計画に基づいて将来に生じる事業費を算定すると、計画の初期段階において損傷・劣化が進行している橋梁の対策が集中するため、必要事業費が増大することが予測されます。このため、年間予算を超える場合は、優先して補修を行う橋梁を選定する必要があります。優先度は総合重要度により適切に評価を行います。

● 総合重要度の評価

- 平準化にあたり、補修が必要な橋梁の優先度を評価します。優先度については、健全度評価点と諸元重要度に重み係数を考慮した総合重要度で評価します。
- ただし、点検等の結果、損傷・劣化が著しく、直ちに対応すべきと判断された橋梁については、優先的に修繕を行っていきます。

$$\text{総合重要度} = \alpha \times \text{諸元重要度評価点} + (1-\alpha) \times \text{部材健全度評価点}$$

α ：重み係数 ($\alpha=0.5$)

4.2 事業費の算出

4.2.1 維持管理シナリオの設定

橋長 5m 以上の橋梁については「予防保全型」、橋長 5m 未満の橋梁については「事後保全型」の補修シナリオを定め、事業計画を立案します。

- 予防保全および事後保全の事業費
予防保全型および事後保全型の維持管理とは、定期点検により把握する橋梁の損傷状況に応じて、本計画に基づいた管理基準で適切な修繕を実施することで橋梁の長寿命化を図るものであり、これを継続した場合の事業費になります。
- 事業費の平準化
長寿命化修繕計画に基づく維持管理による事業費は、年度ごとにバラツキが生じます。また計画の初期段階においては、現時点で損傷がある橋梁の補修が集中するため事業費が増大します。計画をより実効性のあるものとするために、年度ごとの事業費の平準化を図ります。

4.2.2 管理基準

- 管理基準と補修判定
管理基準は、部材ごとに表-4.4 のように設定し、劣化予測による将来の健全度が管理基準に達した場合に補修等の対策を実施します。

表-4.4 部材ごとの管理基準

		管理基準	
		予防保全型	事後保全型
鋼橋	上部工	Ⅱ	Ⅲ
	コンクリート床版	Ⅱ	Ⅲ
コンクリート橋	上部工	Ⅱ	Ⅲ
	床版	Ⅱ	Ⅲ
共通	下部工(RC)	Ⅱ	Ⅲ
	下部工(鋼)	Ⅱ	Ⅲ
	支承	Ⅱ	Ⅲ
	伸縮装置	Ⅱ	Ⅲ
	舗装	Ⅱ	Ⅲ

4.2.3 事業計画概要

- 10年間の短期事業計画においては、中長期ビジョンである予防保全型維持管理の早期実現を目的とした補修事業を、必要な予算を投じて実施します。
- 実現可能性を考慮し、以下に示す2プランを計画しています。
 - プラン①：
前述の121橋を対象とした、基本的な事業計画
 - プラン②：
プラン①の中で、早期対策が必要なⅢ判定以上の橋梁60橋を対象とした事業計画
- プラン①を基本計画と定めていますが、当面はプラン②を目標に事業を実施します。
- 事業の効率化を図るため、図-4.1（プラン①）および図-4.2（プラン②）に示すとおり、予算の平準化を図っています。
- 橋梁点検結果を基に、個々の橋梁について、修繕の内容、修繕の実施時期や次回点検実施時期を計画します。

事業費用の推移

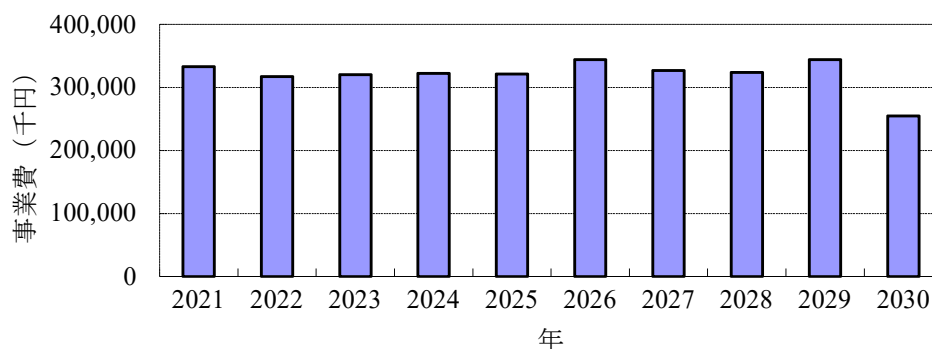


図-4.1 プラン①における単年度予算の推移

事業費用の推移

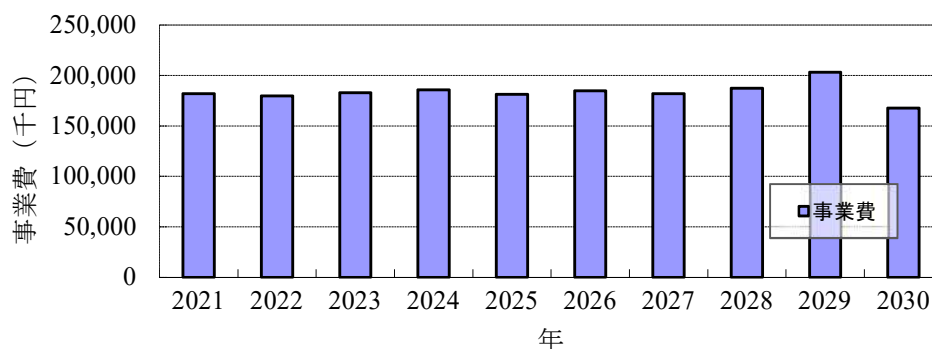





図-4.2 プラン②における単年度予算の推移

【コンクリート橋の対策例】

維持管理方法	対策のタイミング	損傷状況(例)	標準的な補修工法と概算工事費
予防保全	Ⅱ判定		<ul style="list-style-type: none"> ・表面含浸工 ・ひび割れ注入工 【概算工事費】 約20,000円/m ²
劣化の進行		工費の増加	
事後保全	Ⅲ判定		<ul style="list-style-type: none"> ・表面含浸工 ・ひび割れ注入工 ・断面修復工(大) 【概算工事費】 約100,000円/m ²
劣化の進行		工費の増加	
事後保全 (架替)	Ⅳ判定		<ul style="list-style-type: none"> ・架替え 【概算工事費】 約800,000円/m ²

【道路橋定期点検要領（国土交通省,平成 26 年 6 月）より損傷写真を引用】

図-4.3 健全度ごとの概算対策費用

※) Ⅳ判定の橋梁については、詳細設計段階で LCC を考慮した比較検討を行い、補修による延命化と架け替えのうち、最適な対策工を判断します。

第 5 章 長寿命化修繕計画（記録）

- 継続的に点検・診断・措置の結果を記録していきます。
- 効果的な維持管理に改善していくため、蓄積した結果を効果的に活用します。

第6章 長寿命化修繕計画による効果と見直し・改善

6.1 長寿命化修繕計画による効果

- 長寿命化修繕計画では、橋梁の修繕及び架替えに係る費用の縮減を図るために、今後発生することが考えられるすべてのコストの最小化を図る必要があります。
- 橋梁毎に将来的に発生する維持管理費用を適切に予測し、健全度に応じたきめ細かな修繕を繰り返し実施することで、LCCの最小化を図ります。(図-6.1)
- 長寿命化修繕計画を策定する121橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来の事後保全型が189.4億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が81.2億円となり、108億円(約57%)のコスト縮減効果が見込まれます。(図-6.2)

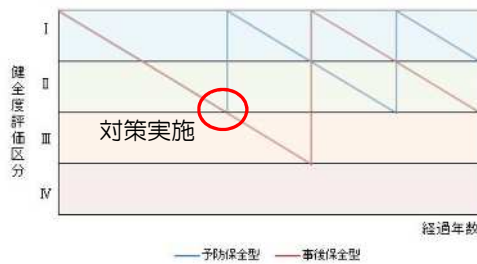


図-6.1 対策時期

表-6.1 費用比較一覧表

予防保全補修費合計	8,120百万円
事後保全補修費合計	18,942百万円
軽減費用	10,822百万円
費用軽減率	57%

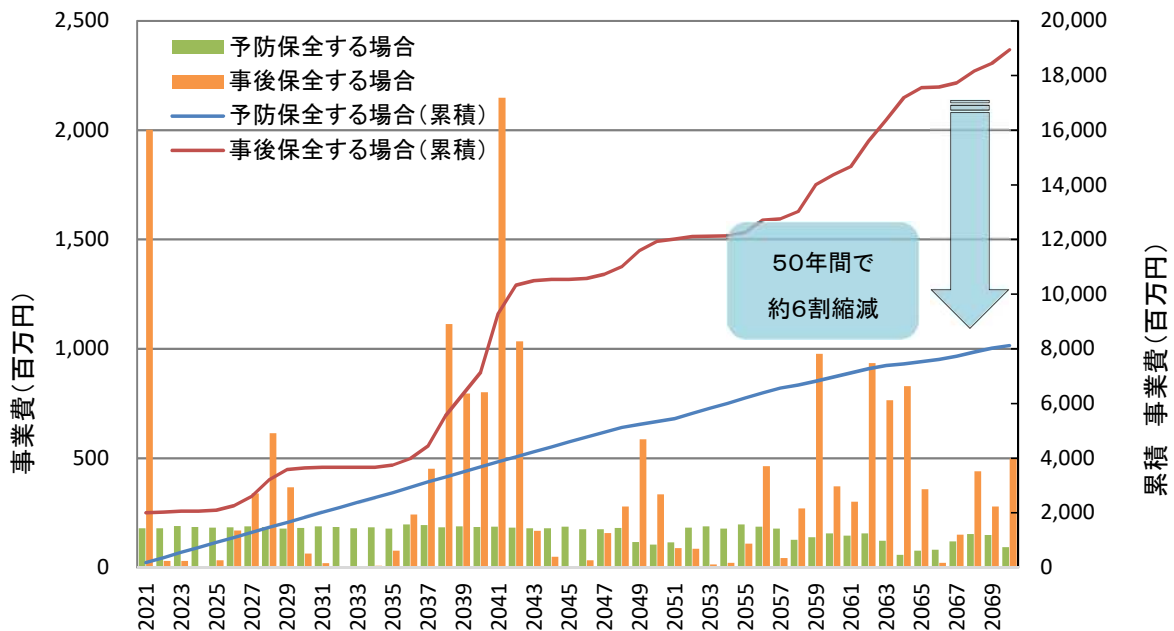


図-6.2 長寿命化 修繕計画対象橋梁全体のコスト縮減効果

注記) 当初の10年間は、Ⅲ判定以上の橋梁を対象に、Ⅱ判定以下に改善する補修工事に傾注した計画である。

(プラン②)

6.2 計画の見直しと改善

- 2 巡目の点検が完了した後に、その結果を踏まえて、あらためて長寿命化計画を見直します。
- その見直しの時期は、2024（令和 6）年度を予定しています。
- 見直しに際しては、1 巡目と 2 巡目の点検結果の推移を勘案した、劣化予測を導入することを予定しています。
- 上記のように、点検のサイクルごとに点検結果や事業計画（設計・工事）の進捗状況を勘案し長寿命化修繕計画を見直すことで PDCA サイクルを回し、計画の最適化や事業費のさらなる縮減を図ります。

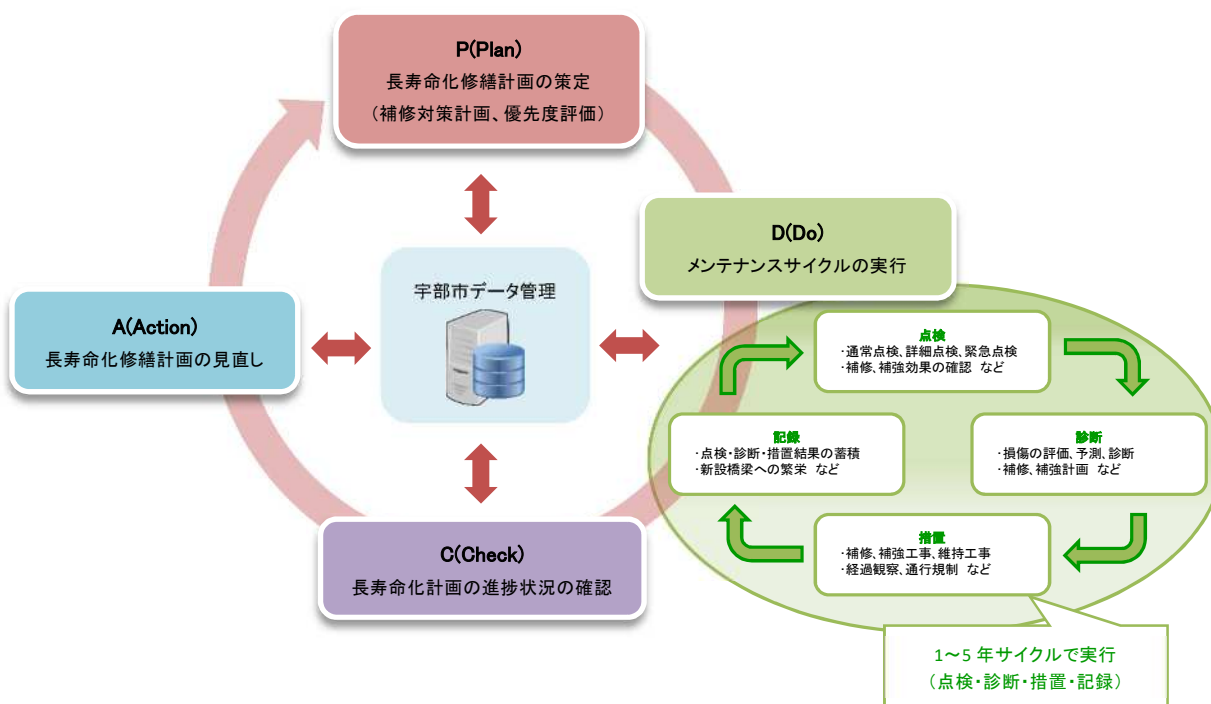


図-6.3 維持管理のPDCA サイクル

6.3 新技術等の活用及び費用の縮減に向けた具体的な取り組み

- 今後の老朽化対策においては、事業の効率化を図るため、従来工法のみではなく新工法や新材料などの新技術等を加えた比較検討などを実施します。
- 今後の人口推移や予算状況を踏まえ、集約化・撤去を視野に入れて取り組んでいきます。

具体的には、今後5年以内に、迂回路が存在し交通量の少ない1橋の集約化・撤去を検討し、今後5年間の維持管理に係る点検等の費用（約50万円）を縮減することを目指します。

第7章 計画策定担当部署および

意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

- 計画策定担当部署
宇部市 都市整備部 道路整備課 TEL：0836-34-8423
- 意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者
山口大学大学院 創成科学研究科
工学系学域 社会建設工学分野
麻生 稔彦 教授

別表（橋梁点検計画一覧表）

2020年3月31日時点

橋梁名	路線名	所在地		橋梁の種類	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	最新点検結果		定期点検(5箇年) (西暦)				対策内容	対策予定年度 (※着手は設計含む)			
								点検年度 (西暦)	判定区分	2019年	2020年	2021年	2022年		2023年	着手予定	完了予定	
越川橋	丸尾岐波浦日ノ山線	宇部市	大字東岐波	PC橋	1966	7.3	5.5	2016	I		○							
水落橋	丸尾岐波浦日ノ山線	宇部市	大字東岐波	PC橋	1996	11.7	6.8	2017	II			○						
高橋	花園岐波浦線	宇部市	大字東岐波	PC橋	1969	9.4	6.0	2015	II	○								
三反田橋	古殿王子2号線	宇部市	大字東岐波	PC橋	1980	12.0	7.6	2016	II	○								
前橋	片倉藏地線	宇部市	大字東岐波	RC橋	1996	5.8	6.2	2018	II				○					
沖田川橋	吉田丸尾線	宇部市	大字東岐波	PC橋	1994	9.9	9.0	2016	I		○							
無名橋0007	新浦瀬田線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1970	2.3	6.7	2016	II	○								
無名橋0008	新浦瀬田線	宇部市	大字西岐波	ボックスカルバート	1993	5.6	8.7	2016	I		○							
無名橋0009	片倉浜田線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1970	3.6	4.7	2018	II				○					
無名橋0010	片倉浜田線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1970	3.3	4.3	2018	I				○					
無名橋0011	片倉浜田線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1963	2.6	10.1	2018	II					○				
無名橋0012	床波吉田線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1963	2.8	8.0	2016	I		○							
2号橋	床波駅漁港線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1971	9.5	6.0	2016	II		○							
常盤橋	常盤公園江頭線	宇部市	大字沖宇部	ボックスカルバート	1978	3.6	11.0	2016	I		○							
跨道橋0015	常盤公園開片倉線	宇部市	大字沖宇部	PC橋	1958	7.0	8.7	2014	I	○								
跨道橋0016	常盤公園開片倉線	宇部市	大字沖宇部	PC橋	2000	6.0	10.2	2014	I	○								
無名橋0017	大小路寺の前線	宇部市	大字上宇部	RC橋	1970	4.6	4.4	2018	II				○					
無名橋0018	大小路寺の前線	宇部市	大字上宇部	混合橋	2005	4.0	11.5	2016	II	○								
塚穴橋	草江野中線	宇部市	亀浦五丁目	PC橋	1970	5.2	3.5	2018	II				○					
無名橋0020	草江野中線	宇部市	大字沖宇部	RC橋	1950	2.8	4.8	2017	II		○							
無名橋0021	西の宮野中線	宇部市	大字上宇部	RC橋	1970	5.2	12.6	2016	II	○								
無名橋0022	西の宮野中線	宇部市	大字沖宇部	混合橋	1970	5.0	7.7	2016	II		○							
無名橋0023	沼風呂ヶ追線	宇部市	大字上宇部	RC橋	1960	3.6	8.1	2017	II				○					
無名橋0024	沼風呂ヶ追線	宇部市	大字上宇部	RC橋	1960	4.9	12.6	2016	II	○								
下浜田橋	神原町沼線	宇部市	神原町一丁目	PC橋	1951	5.3	9.9	2016	III	○					断面修復	2022	2023	
塩田橋	神原町草江線	宇部市	大字沖宇部	PC橋	1979	6.6	18.1	2016	I		○							
無名橋0027	神原町草江線	宇部市	大字沖宇部	ボックスカルバート	1998	2.7	15.5	2016	I		○							
思田橋	神原町草江線	宇部市	大字上宇部	混合橋	1998	2.9	19.5	2016	I		○							
無名橋0029	空港線	宇部市	岬町一丁目	ボックスカルバート	1985	4.4	20.1	2016	I		○							
無名橋0030	思田八王子線	宇部市	笹山町二丁目	RC橋	1963	2.9	8.3	2017	II				○					
無名橋0031	思田八王子線	宇部市	末広町	RC橋	1963	2.7	9.4	2017	II				○					
無名橋0032	思田八王子線	宇部市	末広町	ボックスカルバート	2003	2.4	9.7	2016	I		○							
明神橋	岬八王子線	宇部市	岬町二丁目	PC橋	1949	8.4	14.0	2016	II	○								
新堀橋	栄町線	宇部市	寿町一丁目	PC橋	1977	8.4	25.0	2016	II		○							
寿小橋	宇部新川思田線	宇部市	寿町一丁目	PC橋	1959	9.0	16.9	2015	III	○						断面修復	2023	2025
御手洗橋0036	真綿川西通り2号線	宇部市	中宇部西岩田	RC橋	1970	5.5	11.2	2016	II	○								
無名橋0037	上条金山線	宇部市	文京町	RC橋	1989	3.4	6.8	2016	II	○								
浜田橋	平原浜田線	宇部市	大字藤曲	PC橋	1986	5.0	12.4	2017	I		○							
無名橋0039	藤曲厚東川線	宇部市	文京町	ボックスカルバート	2004	5.0	12.4	2017	II				○					
無名橋0042	昭和開作岩鼻線	宇部市	大字藤曲	RC橋	1980	8.0	8.2	2017	II				○					
無名橋0043	岩鼻浜田線	宇部市	大字中山	ボックスカルバート	1970	2.5	8.2	2017	I				○					
無名橋0045	馬渡橋西割線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1970	2.9	8.6	2017	II				○					
無名橋0046	馬渡橋西割線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1970	2.2	8.4	2017	II				○					
無名橋0047	馬渡橋西割線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1970	2.0	9.1	2017	II				○					
無名橋0048	馬渡橋西割線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1970	2.0	8.8	2017	II				○					
無名橋0049	馬渡橋西割線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1970	2.0	9.5	2017	II				○					
無名橋0050	馬渡橋西割線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1970	2.0	10.1	2017	II				○					
無名橋0051	馬渡橋西割線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1968	2.0	9.2	2017	II				○					
宮川橋	西宇部妻崎線	宇部市	大字東須恵	RC橋	1955	9.0	9.8	2014	III	○						断面修復	2021	2021
明神橋	西宇部妻崎線	宇部市	大字岐波	ボックスカルバート	1987	5.5	9.5	2016	I		○							
無名橋0054	中野開作黒石目出線	宇部市	大字中野開作	ボックスカルバート	1989	2.5	11.0	2017	II				○					
無名橋0055	中野開作黒石目出線	宇部市	大字中野開作	ボックスカルバート	1989	3.0	11.0	2017	II				○					
無名橋0056	中野開作黒石目出線	宇部市	大字妻崎開作	ボックスカルバート	1989	2.1	26.0	2017	II				○					
無名橋0057	中野開作黒石目出線	宇部市	大字妻崎開作	ボックスカルバート	1987	3.7	23.4	2016	I				○					
無名橋0058	中開作中野線	宇部市	大字中野開作	RC橋	1960	2.6	5.3	2018	II					○				
無名橋0060	中開作中野線	宇部市	大字中野開作	RC橋	1950	5.3	5.0	2016	II		○							
無名橋0061	中開作中野線	宇部市	大字中野開作	RC橋	1970	2.4	6.0	2016	II		○							
無名橋0062	宇部駅洗川線	宇部市	大字岐波	RC橋	1970	3.1	6.4	2016	II				○					
無名橋0063	宇部駅洗川線	宇部市	大字際波	石橋	1950	2.0	3.5	2016	III	○						断面修復	2029	2030
無名橋0064	広瀬宇部駅線	宇部市	大字際波	RC橋	1970	2.5	6.5	2018	II				○					
無名橋0065	沖ノ且末信持世寺線	宇部市	大字沖の且	RC橋	1970	2.4	3.6	2017	II				○					
無名橋0066	沖ノ且末信持世寺線	宇部市	大字沖の且	RC橋	1950	4.7	4.4	2016	II	○								
無名橋0067	沖ノ且末信持世寺線	宇部市	大字末信	RC橋	1950	2.8	2.5	2016	II	○								
無名橋0068	沖ノ且末信持世寺線	宇部市	大字末信	RC橋	1970	4.0	2.6	2016	II	○								
無名橋0069	沖ノ且末信持世寺線	宇部市	大字末信	RC橋	1970	4.1	6.2	2015	II	○								
栗坪橋	沖ノ且末信持世寺線	宇部市	大字吉見	RC橋	1970	3.1	8.2	2018	II				○					
無名橋0071	末信棚井線	宇部市	大字末信	RC橋	1970	3.0	5.4	2016	II		○							
無名橋0072	末信棚井線	宇部市	大字末信	RC橋	1970	4.1	7.9	2018	II				○					
無名橋0073	棚井線	宇部市	大字棚井	RC橋	1970	5.5	6.4	2017	II				○					
棚井中橋	棚井線	宇部市	大字棚井	RC橋	1970	2.9	5.8	2018	II				○					
無名橋0075	棚井線	宇部市	大字棚井	RC橋	1970	3.4	5.9	2017	II				○					
無名橋0076	田の小野車地線	宇部市	大字車地	RC橋	1970	4.0	7.3	2016	II		○							
無名橋0077	田の小野車地線	宇部市	大字車地	RC橋	1970	5.6	5.3	2018	II				○					
無名橋0078	栗師堂立熊線	宇部市	大字木田	RC橋	1950	4.0	3.3	2016	II		○							
第2神田橋	栗師堂立熊線	宇部市	大字吉見	RC橋	1970	4.0	2.9	2018	II				○					
舞瀬橋	割木松小野線	宇部市	大字山中	PC橋	1971	8.0	6.2	2016	II				○					
昭和橋	割木松小野線	宇部市	大字藤河内	RC橋	1970	5.4	4.0	2018	II				○					
無名橋0082	割木松小野線	宇部市	大字松小野	RC橋	1970	3.0	6.9	2016	II		○							
無名橋0083	割木松小野線	宇部市	大字松小野	RC橋	1970	2.3	16.2	2018	II				○					
無名橋0085	美保阿武瀬線	宇部市	大字小野	RC橋	1980	8.8	5.0	2018	II				○					
鎌佐橋	下小野平原市小野線	宇部市	大字小野	PC橋	1980	10.9	5.8	2015	II		○							
平原橋	下小野平原市小野線	宇部市	大字小野	PC橋	1970	5.3	7.1	2016	II				○					
平野橋	下小野平原市小野線	宇部市	大字小野	RC橋	1980	9.5	5.6	2016	II		○							
無名橋0089	市小野宗国線	宇部市	大字小野	RC橋	1996	8.3	7.2	2018	II				○					
無名橋0090	妻崎開作線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1970	2.3	5.5	2018	II				○					

橋梁名	路線名	所在地		橋梁の種類	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	最新点検結果		定期点検 (5箇年) (西暦)					対策内容	対策予定年度 (※着手は設計含む)		
								点検年度 (西暦)	判定区分	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年		着手予定	完了予定	
無名橋0091	妻崎開作線	宇部市	大字妻崎開作	ボックスカルバート	2001	3.4	6.1	2017	II									
無名橋0092	高嶺中山線	宇部市	大字川上	ボックスカルバート	1983	11.4	12.9	2016	II	○								
無名橋0093	大門前線	宇部市	大字東岐波	ボックスカルバート	1966	2.8	11.4	2017	II		○							
門前橋	立山北原引野線	宇部市	大字東岐波	鋼橋	1980	10.4	3.0	2016	II		○							
大田橋	立山北原引野線	宇部市	大字東岐波	RC橋	1960	3.0	4.6	2018	II				○					
無名橋0096	立山北原引野線	宇部市	大字東岐波	RC橋	1970	5.6	6.4	2017	II			○						
柳ヶ瀬橋	柳ヶ瀬線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1988	9.3	5.2	2018	II			○						
山村跨線橋	床波南方八幡宮上の原線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1970	5.5	3.7	2016	I		○							
無名橋0099	園の辻今村線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1980	7.7	4.4	2018	II				○					
琴芝橋	琴芝通り南京納川津線	宇部市	寿町二丁目	PC橋	1968	8.8	8.0	2015	II	○								
無名橋0101	京納山門線	宇部市	大字上宇部	RC橋	1962	3.2	8.2	2017	II			○						
無名橋0102	男山線	宇部市	大字川上	RC橋	1980	8.5	12.0	2018	II				○					
無名橋0103	新聞作妻崎線	宇部市	大字妻崎開作	ボックスカルバート	不明	2.4	5.9	2018	I				○					
梅田川橋	新聞作妻崎線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1980	7.2	3.9	2018	III				○			断面修復	2021	2022
無名橋0105	妻崎中原線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1991	10.7	6.2	2018	I				○					
無名橋0106	東割黒石線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1970	2.2	7.7	2016	II	○								
無名橋0107	東割黒石線	宇部市	大字妻崎開作	ボックスカルバート	1963	2.0	7.8	2016	I		○							
無名橋0109	東割黒石線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1950	5.0	5.4	2017	I			○						
無名橋0110	東割黒石線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1950	2.5	5.4	2017	I			○						
無名橋0111	東割黒石線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1970	3.9	7.1	2017	II			○						
無名橋0112	東割黒石線	宇部市	大字東須志	PC橋	1970	5.5	7.5	2018	I				○					
無名橋0113	沖の且申線	宇部市	大字沖ノ且	RC橋	1950	2.5	10.6	2017	II				○					
無名橋0114	沖の且申線	宇部市	大字岐波	ボックスカルバート	2001	4.3	10.7	2017	II				○					
無名橋0115	沖の且申線	宇部市	大字岐波	ボックスカルバート	1993	2.7	11.7	2017	II				○					
無名橋0116	里の尾線	宇部市	大字岐波	RC橋	1970	6.1	6.4	2017	II				○					
無名橋0118	田の小野城生原車地線	宇部市	大字善和	RC橋	1963	3.5	26.6	2017	II				○					
第2神田橋	田の小野城生原車地線	宇部市	大字山中	RC橋	1969	2.0	2.7	2017	II			○						
明治橋	岐波門前線	宇部市	大字東岐波	PC橋	1980	12.2	6.0	2015	III	○					断面修復	2028	2029	
無名橋0122	磯地新出線	宇部市	大字東岐波	鋼橋	1980	10.8	5.5	2015	II	○								
無名橋0123	花園横尾線	宇部市	大字東岐波	RC橋	1970	3.6	4.1	2016	II	○								
無名橋0124	花園岐波線	宇部市	大字東岐波	鋼橋	1980	10.7	2.5	2015	III	○					断面修復	2020	2020	
石井出橋	花園水落線	宇部市	大字東岐波	鋼橋	1980	10.7	2.5	2016	II	○								
無名橋0126	八反田線	宇部市	大字東岐波	鋼橋	1980	9.6	2.3	2015	II	○								
紺屋橋	大田花園線	宇部市	大字東岐波	鋼橋	1980	10.6	5.6	2015	II	○								
無名橋0128	花ヶ浴東五反田線	宇部市	大字東岐波	RC橋	1950	2.0	3.1	2017	I				○					
新川橋	花ヶ浴東五反田線	宇部市	大字東岐波	RC橋	1970	10.2	3.5	2017	II				○					
無名橋0130	小沢五反田線	宇部市	大字東岐波	RC橋	1970	2.2	6.6	2017	II			○						
無名橋0131	小沢五反田線	宇部市	大字東岐波	RC橋	1970	2.5	7.6	2017	II				○					
松山橋	長原三神社線	宇部市	大字東岐波	ボックスカルバート	1995	2.2	9.7	2017	II			○						
郷橋	長原郷線	宇部市	大字東岐波	鋼橋	1980	10.4	3.5	2016	II	○								
王子橋	真名河内王子線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1970	4.3	5	2017	II		○							
柳富橋	山村上の原大田線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1970	5.5	6.6	2016	I		○							
無名橋0136	山村上の原大田線	宇部市	大字東岐波	PC橋	1970	6.3	7.5	2018	I				○					
無名橋0137	山村上の原大田線	宇部市	大字東岐波	PC橋	1970	5.3	7.9	2017	I				○					
無名橋0138	上の原線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1970	3.6	4.1	2017	II				○					
無名橋0139	丸尾線	宇部市	大字東岐波	RC橋	1970	2.4	10.3	2017	II				○					
無名橋0140	神田線	宇部市	大字東岐波	RC橋	1950	3.1	3.7	2017	II			○						
沖田川13号橋	沖田線	宇部市	大字東岐波	混合橋	2001	7.1	6.3	2018	II				○					
沖田川12号橋	沖田線	宇部市	大字東岐波	混合橋	2001	5.3	3.5	2017	II				○					
吉田橋	西岐波東海岸線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1993	9.4	8.2	2018	I				○					
天王橋	吉田沖の山線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1973	5.3	5.6	2017	II			○						
無名橋0145	白土柳ヶ瀬線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1950	8.2	4.8	2016	I			○						
白土橋	白土吉田線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1980	9	3.8	2018	II				○					
無名橋0147	江頭床波漁港線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1970	3	4.2	2016	II	○								
無名橋0148	江口野中線	宇部市	則貞四丁目	RC橋	1970	4.1	5.8	2017	I				○					
無名橋0149	柳線	宇部市	柳町一丁目	ボックスカルバート	1990	2.7	4.2	2018	I					○				
須賀橋	柳町八王子線	宇部市	柳町一丁目	ボックスカルバート	1989	2	6	2017	II			○						
一本橋	柳町通り線	宇部市	松山町五丁目	ボックスカルバート	1989	4.7	6.9	2017	I				○					
亀前橋	柳町通り線	宇部市	末広町	ボックスカルバート	1999	4.9	6	2018	I					○				
無名橋0153	五反田笹山線	宇部市	東芝中町	RC橋	1970	2.5	3.3	2017	II				○					
無名橋0154	五反田笹山線	宇部市	東芝中町	混合橋	1970	2.4	5.4	2016	III	○					断面修復	2021	2022	
無名橋0156	清水崎尾田線	宇部市	神原町二丁目	RC橋	1970	5.7	2.4	2016	II	○								
無名橋0157	清水川梶返線	宇部市	東梶返三丁目	RC橋	1950	4.7	7.6	2017	II				○					
無名橋0158	梶返野中線	宇部市	東梶返二丁目	ボックスカルバート	1985	2.2	10.5	2018	I				○					
無名橋0159	梶返野中線	宇部市	大字沖宇部	混合橋	1950	2.4	3.2	2017	II				○					
梶返橋	神原町線	宇部市	神原町一丁目	RC橋	1970	8.7	5.9	2018	I				○					
原田橋	柳町線	宇部市	寿町三丁目	RC橋	1980	8.2	6.4	2016	II	○				○				
無名橋0164	樋ノ口琴芝線	宇部市	大字中宇部	RC橋	1950	3.6	4.1	2014	I	○								
無名橋0166	まかよ小串線	宇部市	大字上宇部	RC橋	不明	3.1	5.8	2018	II					○				
無名橋0167	寺の前大小路線	宇部市	大字上宇部	RC橋	1970	2	3.6	2017	II				○					
渦橋	山門参宮通り線	宇部市	大字上宇部	RC橋	1984	5.2	5	2017	II				○					
無名橋0169	川津線	宇部市	大字中宇部	RC橋	1980	6.8	2.8	2017	II				○					
無名橋0170	維新山西山線	宇部市	大字中宇部	RC橋	1980	9.5	4	2017	II			○						
無名橋0171	藤曲門前線	宇部市	大字中山	RC橋	1970	4.6	4.9	2017	II			○						
無名橋0172	尾崎大笠線	宇部市	大字中山	RC橋	1970	3.6	2.4	2018	II				○					
無名橋0174	江の内線	宇部市	大字藤曲	RC橋	1970	2.2	2.6	2018	II				○					
無名橋0175	江の内線	宇部市	大字藤曲	RC橋	1950	3.8	3	2016	II	○								
無名橋0176	藤曲3号線	宇部市	大字藤曲	石橋	不明	3.5	1.1	2018	II				○					
無名橋0177	藤曲3号線	宇部市	大字藤曲	PC橋	1970	4.3	6.1	2018	II				○					
無名橋0178	新聞作線	宇部市	大字妻崎開作	ボックスカルバート	1950	3.5	3	2018	II				○					
無名橋0179	新聞作線	宇部市	大字妻崎開作	PC橋	不明	2.3	2.5	2018	II				○					
中原橋	中原2号線	宇部市	大字東須志	ボックスカルバート	1998	7.9	14.5	2018	I				○					
西園橋	西園4号線	宇部市	大字東須志	PC橋	1997	7.9	7.2	2018	I				○					
無名橋0182	流川中野線	宇部市	大字東須志	石橋	1970	5.5	3.2	2017	I				○					
無名橋0183	流川中野線	宇部市	大字東須志	RC橋	1970	2	4.3	2017	II				○					
無名橋0184	流川崎線	宇部市	大字妻崎開作	PC橋	1970	4.3	6.4	2018	II				○					
無名橋0185	流川崎線	宇部市	大字東須志	PC橋	1970	6.3	6	2015	II	○								

橋梁名	路線名	所在地		橋梁の種類	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	最新点検結果		定期点検 (5箇年) (西暦)					対策内容	対策予定年度 (※着手は設計含む)		
								点検年度 (西暦)	判定区分	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年		着手予定	完了予定	
無名橋0187	西割塩屋台線	宇部市	大字妻崎開作	混合橋	1970	2.5	9.6	2018	II									
無名橋0188	西割塩屋台線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1970	2.5	8.7	2018	II									
無名橋0189	西割塩屋台線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1960	2.5	8.6	2018	II									
無名橋0190	西割塩屋台線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1960	2.5	8.9	2018	II									
無名橋0191	中野土手町線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1950	2.4	2.5	2018	II				○					
無名橋0192	中野土手町線	宇部市	大字妻崎開作	ボックスカルバート	1970	2	3.2	2017	II									
無名橋0193	中野土手町線	宇部市	大字妻崎開作	ボックスカルバート	1970	3	3.6	2015	III	○					断面修復	2024	2025	
無名橋0194	宮の前塩屋台線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1984	2.3	4.1	2017	II				○					
無名橋0195	宮の前塩屋台線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1950	2.1	4	2016	II									
無名橋0196	宮の前塩屋台線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1970	2.6	4.7	2015	II				○					
無名橋0197	宮の前塩屋台線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1970	3.8	4	2016	II				○					
無名橋0198	厚南中学校線	宇部市	大字中野開作	RC橋	1970	3.7	2	2017	II				○					
無名橋0199	中野開作線	宇部市	大字中野開作	RC橋	1960	4.2	7.1	2018	II					○				
無名橋0200	中野開作線	宇部市	大字中野開作	混合橋	1970	3.5	2.9	2017	II				○					
上開作橋	沖の且上開作線	宇部市	大字岐波	RC橋	1963	8.6	5.2	2015	II				○					
無名橋0202	上開作線	宇部市	大字岐波	ボックスカルバート	1950	2	5.5	2016	II				○					
無名橋0203	中開作西開作線	宇部市	大字岐波	ボックスカルバート	1988	6.2	7	2017	II					○				
無名橋0204	上中野線	宇部市	大字岐波	ボックスカルバート	1987	5.5	4.8	2017	II					○				
無名橋0208	上中野迫条線	宇部市	大字岐波	RC橋	1970	4	8.1	2018	II						○			
無名橋0209	沖の且西字部線	宇部市	大字沖ノ且	RC橋	1970	2.9	8.3	2018	III						断面修復	2029	2030	
無名橋0210	沖の且西字部線	宇部市	大字際波	RC橋	1970	5.5	5.1	2016	II				○					
上御撫育橋	沖の且西字部線	宇部市	大字際波	混合橋	1970	3.5	6.7	2015	III				○		断面修復	2022	2023	
無名橋0212	串馬の背線	宇部市	大字広瀬	石橋	1950	2.4	2.8	2018	II							○		
無名橋0213	串馬の背線	宇部市	大字広瀬	RC橋	1970	4.5	19.4	2018	II								○	
無名橋0214	串線	宇部市	大字際波	RC橋	1970	6.2	7.6	2015	III				○		断面修復	2025	2026	
無名橋0215	片山引地線	宇部市	大字棚井	RC橋	1970	3.9	5.8	2016	I					○				
無名橋0216	片山引地線	宇部市	大字棚井	PC橋	1960	3.7	3.2	2016	II				○					
無名橋0217	片山線	宇部市	大字棚井	RC橋	1990	4.6	6.6	2016	II				○					
無名橋0218	野田線	宇部市	大字棚井	RC橋	1950	4.8	8.1	2018	II							○		
無名橋0219	垣の内線	宇部市	大字棚井	RC橋	1950	5.2	3.2	2016	II				○					
無名橋0220	官尾線	宇部市	大字棚井	RC橋	1960	5.5	6.9	2016	II				○					
無名橋0221	棚井3号線	宇部市	大字棚井	RC橋	1970	2.4	5	2016	II				○					
無名橋0222	棚井4号線	宇部市	大字棚井	RC橋	1970	2.1	5	2016	II				○					
無名橋0223	末信棚井2号線	宇部市	大字末信	RC橋	1950	6	4.4	2016	I					○				
無名橋0227	吉ヶ原線	宇部市	大字善和	RC橋	1970	4.3	3	2016	II				○					
無名橋0228	善和城生原線	宇部市	大字善和	RC橋	1980	9	4.9	2018	II							○		
無名橋0229	東谷線	宇部市	大字善和	石橋	1950	2	1.5	2016	II				○					
無名橋0230	東谷線	宇部市	大字善和	PC橋	1950	2	2	2016	I				○					
第2木田橋	木田線	宇部市	大字木田	RC橋	1980	7.1	5.8	2018	II						○			
無名橋0232	割木松線	宇部市	大字山中	RC橋	1970	6.2	4.3	2015	II				○					
無名橋0233	他屋線	宇部市	大字椋小野	RC橋	1970	4.8	3.1	2016	II				○					
無名橋0234	上椋小野線	宇部市	大字椋小野	RC橋	1970	3.5	4.9	2018	II						○			
無名橋0235	上藤河内線	宇部市	大字藤河内	ボックスカルバート	2004	2	7.5	2018	II						○			
無名橋0236	大山藤河内線	宇部市	大字小野	RC橋	1982	3.2	5.4	2018	II						○			
無名橋0237	平原権田畑線	宇部市	大字小野	RC橋	1962	3.2	6	2016	II				○					
無名橋0238	上小野重倉線	宇部市	大字小野	RC橋	1960	2.1	6.2	2018	II						○			
無名橋0239	中開作線	宇部市	大字中野開作	鋼橋	1980	5	1.7	2017	II				○					
無名橋0240	多賀丘松見町線	宇部市	大字岐波	RC橋	1980	4.7	5.5	2018	II						○			
無名橋0241	東桃山線	宇部市	大字小串	ボックスカルバート	1950	3.9	4	2016	II				○					
無名橋0242	東市小野線	宇部市	大字小野	RC橋	1998	7.4	8.2	2018	II						○			
無名橋0243	まかよ山門線	宇部市	大字上宇部	RC橋	1980	6.5	4.5	2018	II						○			
無名橋0244	まかよ山門線	宇部市	大字上宇部	RC橋	1970	3.6	7	2018	III						○	断面修復	2029	2030
無名橋0245	中野開作2の割 前田線	宇部市	大字中野開作	RC橋	1970	3	9.1	2018	II						○			
大沢路線橋	大沢新浦線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1985	10.6	10.4	2017	II				○					
無名橋0247	西平原線	宇部市	大字藤曲	RC橋	1970	3.3	4.4	2016	III				○		断面修復	2026	2027	
無名橋0248	中野開作2号線	宇部市	大字東須恵	RC橋	1980	8.6	4.8	2018	II						○			
無名橋0249	上中野大森線	宇部市	大字岐波	ボックスカルバート	1987	7.1	7.2	2017	II				○					
無名橋0250	織地線	宇部市	大字東岐波	RC橋	1950	5.6	2.9	2017	II					○				
無名橋0251	大小路南側線	宇部市	大字上宇部	PC橋	1980	7.8	5.7	2018	II						○			
無名橋0252	大小路南側線	宇部市	大字上宇部	PC橋	1987	11.6	4.8	2018	II						○			
無名橋0253	中山線	宇部市	大字上宇部	RC橋	1980	8.8	5.8	2016	II				○					
無名橋0254	持世寺田の小野線	宇部市	大字吉見	石橋	1950	2.6	0.7	2018	III					○	断面修復	2023	2024	
1号市道橋	持世寺田の小野線	宇部市	大字単地	PC橋	1991	11.1	5.2	2018	II						○			
向坂橋	住吉向坂線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1970	4.5	6.2	2018	III				○		断面修復	2028	2029	
無名橋0257	東梶返2号線	宇部市	東梶返二丁目	ボックスカルバート	不明	2.4	5	2018	II						○			
無名橋0258	上条線	宇部市	大字藤曲	ボックスカルバート	不明	3.9	5	2018	II						○			
2号ボックス橋	上条線	宇部市	大字藤曲	ボックスカルバート	不明	4.5	6.3	2018	II						○			
無名橋0260	中野開作3号線	宇部市	大字中野開作	ボックスカルバート	1991	2.3	4.2	2017	II				○					
無名橋0261	中野開作4号線	宇部市	大字中野開作	RC橋	1970	2.5	4.7	2018	II						○			
無名橋0262	黒石中学校線	宇部市	大字東須恵	混合橋	1991	4.8	10.6	2017	II					○				
無名橋0263	向畑線	宇部市	大字広瀬	RC橋	1950	2.2	5	2018	II						○			
無名橋0264	向畑線	宇部市	大字広瀬	RC橋	1970	2.6	11.9	2018	I						○			
無名橋0265	城野団地線	宇部市	大字中野開作	RC橋	1970	2.6	9.8	2018	II						○			
無名橋0266	浜中山線	宇部市	大字中山	ボックスカルバート	1988	3.5	21.4	2017	II				○					
無名橋0267	扇田線	宇部市	大字東岐波	RC橋	1970	2.9	6.7	2017	II					○				
無名橋0268	黒崎線	宇部市	大字東岐波	ボックスカルバート	1998	2.1	9.8	2017	II				○					
無名橋0269	沼3号線	宇部市	沼二丁目	ボックスカルバート	1997	4.4	6	2018	II						○			
四十杭橋	請川2号線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1969	6.4	17.4	2017	II				○					
中山新橋	東文京台線	宇部市	大字南中山	PC橋	1994	10.8	21.1	2018	II						○			
無名橋0273	花香線	宇部市	大字小野	RC橋	1980	8.5	4.8	2018	II						○			
立熊第1号橋	立熊沖田線	宇部市	大字吉見	RC橋	1962	3	2.6	2016	II						○			
管理橋	丸尾岐波渡日ノ山線	宇部市	大字東岐波	PC橋	2002	9.6	5.3	2017	II						○			
無名橋0277	片倉引野線	宇部市	大字西岐波	ボックスカルバート	1980	2.2	8.6	2017	II				○					
流川橋	流川原線	宇部市	大字妻崎開作	RC橋	1976	4.6	16.7	2018	III				○		断面修復	2021	2022	
水尻橋	大畑小松小野線	宇部市	大字東吉部	RC橋	1960	2	5.9	2018	II						○			
岩郷橋	笛太郎線	宇部市	大字東吉部	PC橋	1992	11.1	7.7	2018	II						○			
桜並橋	口ノ坪今富線	宇部市	大字奥万倉	PC橋	1980	12.6	3.5	2015	II				○					

橋梁名	路線名	所在地		橋梁の種類	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	最新点検結果		定期点検(5箇年) (西暦)					対策内容	対策予定年度 (※着手は設計含む)	
								点検年度 (西暦)	判定区分	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年		着手予定	完了予定
上板並橋	口ノ坪今富線	宇部市	大字奥万倉	RC橋	1960	3.4	2.9	2018	II								
今富橋	口ノ坪今富線	宇部市	大字今富	PC橋	1980	9.8	4	2016	III	○					断面修復	2029	2030
第三夏目橋	栄町宗方線	宇部市	大字西万倉	ボックスカルバート	1970	2.4	13	2018	II				○				
東才の上橋	栄町宗方線	宇部市	大字西万倉	混合橋	1967	2.5	10.5	2017	II				○				
下西橋	茶屋奥畑線ヶ原線	宇部市	大字船木	鋼橋	1980	6.9	6.8	2017	II				○				
真名ヶ崎橋	茶屋奥畑線ヶ原線	宇部市	大字船木	RC橋	不明	6.4	8.6	2015	IV	○							
嶺崎橋	茶屋奥畑線ヶ原線	宇部市	大字船木	混合橋	1960	4.3	8.2	2015	II	○							
赤田橋	茶屋奥畑線ヶ原線	宇部市	大字船木	RC橋	1960	4.1	8.5	2015	III	○					断面修復	2027	2028
上霜田橋	霜田小野奥畑浅地線	宇部市	大字船木	PC橋	1980	13.1	7	2016	II			○					
上霜田橋歩道橋	霜田小野奥畑浅地線	宇部市	大字船木	RC橋	1980	13	2	2016	II			○					
第一小野橋	霜田小野奥畑浅地線	宇部市	大字船木	RC橋	1962	4.4	7.1	2017	II				○				
第二小野橋	霜田小野奥畑浅地線	宇部市	大字船木	PC橋	1991	13.7	7.2	2017	II				○				
上山田橋	霜田小野奥畑浅地線	宇部市	大字船木	ボックスカルバート	1970	3	6.4	2018	II					○			
奥畑橋	霜田小野奥畑浅地線	宇部市	大字船木	ボックスカルバート	1966	2.3	6.5	2016	II			○					
奥伊佐地橋	伊佐地黒五郎線	宇部市	大字西万倉	ボックスカルバート	1960	2.7	6.6	2018	II					○			
新五反田橋	伊佐地黒五郎線	宇部市	大字西吉部	PC橋	1977	12	5	2016	III	○					断面修復	2028	2029
信田ノ丸橋	伊佐地黒五郎線	宇部市	大字西吉部	PC橋	1975	8	5.8	2018	II					○			
中務橋	伊佐地黒五郎線	宇部市	大字西吉部	ボックスカルバート	1963	2.8	6.4	2016	II			○					
合ヶ坪橋	開拓道路線	宇部市	大字船木	ボックスカルバート	1963	2.6	7.9	2016	II			○					
藤ヶ瀬橋	藤ヶ瀬黒五郎線	宇部市	大字西吉部	RC橋	1960	3.7	6.4	2016	II			○					
下郷橋	沼田ヶ原長谷線	宇部市	大字芦河内	RC橋	1970	5.2	4.6	2016	III	○					断面修復	2026	2027
郷橋	沼田ヶ原長谷線	宇部市	大字芦河内	混合橋	1962	3.4	6.2	2016	II			○					
上五反田橋	大河内二ツ道祖線	宇部市	大字奥万倉	PC橋	1980	7.5	5	2018	II					○			
柏ノ木橋	大河内二ツ道祖線	宇部市	大字万倉	RC橋	1960	4.2	3.5	2016	II			○					
二ツ道祖橋	大河内二ツ道祖線	宇部市	大字奥万倉	RC橋	1967	2.2	1.1	2016	II			○					
佐古橋	大河内二ツ道祖線	宇部市	大字奥万倉	RC橋	1958	3.2	5.2	2018	II					○			
上浅地橋	中ノ谷小河内線	宇部市	大字西万倉	RC橋	1970	5.7	3.9	2016	III	○					断面修復	2029	2030
下岩滝橋	中ノ谷小河内線	宇部市	大字西万倉	RC橋	1970	6.3	6.2	2018	III				○		断面修復	2028	2029
林庄橋	中ノ谷小河内線	宇部市	大字西万倉	RC橋	2010	8	6.7	2018	II					○			
原橋	船木原線	宇部市	大字船木	PC橋	1980	11.1	4	2015	II	○							
梅田橋	下田町梅田線	宇部市	大字船木	ボックスカルバート	1962	3	6.7	2017	I				○				
才の上橋	下田町梅田線	宇部市	大字船木	ボックスカルバート	1962	3.6	8.3	2017	II				○				
下河中所橋	今富笛太郎線	宇部市	大字西吉部	RC橋	1960	3.9	4.1	2018	II					○			
小河内橋	今富笛太郎線	宇部市	大字奥万倉	RC橋	1960	4.5	3.3	2016	III	○					断面修復	2021	2021
笛太郎橋	今富笛太郎線	宇部市	大字西吉部	RC橋	1963	2.6	3.9	2017	III			○			断面修復	2022	2023
井口橋	奥畑線	宇部市	大字東吉部	RC橋	1960	4.5	3.5	2016	III	○					断面修復	2027	2028
下今小野橋	今小野西側線	宇部市	大字東吉部	RC橋	1970	4.7	1.8	2016	II			○					
上今小野橋	今小野西側線	宇部市	大字東吉部	RC橋	1970	5.5	2.3	2015	II	○							
荒滝橋	荒滝ヶヶ追線	宇部市	大字東吉部	混合橋	1960	3.9	1.6	2018	II					○			
大平橋	大平線	宇部市	大字東吉部	RC橋	1970	6.3	3.6	2017	II			○					
大ヶ追橋	大ヶ追線	宇部市	大字東吉部	ボックスカルバート	1969	2.4	7.5	2017	II				○				
上市橋	市線	宇部市	大字東吉部	RC橋	1970	6	4.9	2015	II	○							
榎田橋	榎田線	宇部市	大字西吉部	PC橋	2004	12.3	6.2	2018	II					○			
下伊佐地橋	伊佐地線	宇部市	大字東吉部	石橋	1962	2.6	3.1	2017	III			○			断面修復	2024	2025
吉部伊佐地橋	伊佐地線	宇部市	大字東吉部	ボックスカルバート	1966	2.6	4.9	2017	II				○				
吉部市橋	第二小坂線	宇部市	大字東吉部	RC橋	1980	8.5	3.4	2015	II	○							
小坂橋	小坂堂線	宇部市	大字東吉部	PC橋	1997	15	5.2	2015	II	○							
大瀬橋	小坂線	宇部市	大字東吉部	PC橋	1987	10.5	6.2	2018	II					○			
神田橋	山中線	宇部市	大字西吉部	ボックスカルバート	1960	3.7	5	2018	II					○			
下城南橋	城南線	宇部市	大字奥万倉	RC橋	2010	4.7	3.9	2018	I					○			
中城南橋	城南線	宇部市	大字東万倉	RC橋	1960	3	3.8	2018	II					○			
大河内橋	大河内線	宇部市	大字奥万倉	RC橋	1980	10.6	4.2	2017	II			○					
河中所橋	今富河中所線	宇部市	大字芦河内	PC橋	1980	10.4	4	2018	II					○			
奈良尾橋	今富大河内線	宇部市	大字西吉部	RC橋	1980	10.1	4.7	2018	I					○			
下奈良尾橋	第二今富大河内線	宇部市	大字西万倉	RC橋	1980	10.1	3	2016	III	○					断面修復	2029	2030
船原橋	船原線	宇部市	大字芦河内	RC橋	1970	5.9	4.5	2017	II			○					
津廻橋	川尻線	宇部市	大字芦河内	RC橋	1980	6.5	4.7	2018	II					○			
川尻橋	川尻線	宇部市	大字芦河内	RC橋	1980	6.9	4.5	2018	II					○			
二ノ瀬橋	二ノ瀬線	宇部市	大字今富	RC橋	1970	6.3	5	2017	II				○				
矢橋橋0763	矢橋線	宇部市	大字矢橋	RC橋	1935	11	4	2015	III	○					断面修復	2025	2026
上伊佐地橋	伊佐地宮ノ下線	宇部市	大字奥万倉	RC橋	1960	3.8	2.9	2018	II					○			
宮ノ下橋	伊佐地宮ノ下線	宇部市	大字奥万倉	RC橋	1980	9	3	2016	II			○					
濠合橋	小河内柏ノ木線	宇部市	大字西万倉	ボックスカルバート	1969	2	4.5	2017	I								
上神元橋	神元線	宇部市	大字東万倉	RC橋	1960	2.8	4.7	2018	II					○			
神元橋	神元線	宇部市	大字東万倉	RC橋	1962	3.6	4.4	2017	II				○				
東山根橋	指月宗方線	宇部市	大字船木	RC橋	1960	2.1	4.9	2018	II					○			
四反田橋	四反田線	宇部市	大字船木	RC橋	1968	2.3	3.4	2017	III			○			断面修復	2021	2022
大船橋	西山樺崎線	宇部市	大字船木	鋼橋	1980	6.6	5	2016	III	○					断面修復	2021	2021
安行橋	第三真名ヶ崎線	宇部市	大字船木	RC橋	1970	6.1	2.5	2018	III				○		断面修復	2029	2030
岡ノ坂橋	茶屋岡ノ坂線	宇部市	大字船木	石橋	1960	2.1	3.4	2018	II					○			
山根橋	下田町指月線	宇部市	大字船木	PC橋	1970	5.9	6.8	2018	II					○			
西山根橋	下田町指月線	宇部市	大字船木	ボックスカルバート	1960	4.1	7	2016	I			○					
第二西山根橋	下田町指月線	宇部市	大字船木	ボックスカルバート	1962	3.2	6.9	2016	I			○					
菅之木橋	水源池道路線	宇部市	大字船木	RC橋	1980	8.5	4	2018	II					○			
指月橋	大野指月線	宇部市	大字船木	PC橋	1976	9.7	5.4	2018	II					○			
寺田橋	下茶屋寺田線	宇部市	大字船木	RC橋	1980	9.4	3	2015	II	○							
第二寺田橋	小野線	宇部市	大字小野	RC橋	1962	3.4	3.2	2016	II			○					
逢坂橋	第三逢坂線	宇部市	大字船木	RC橋	2007	3.7	3.2	2018	II					○			
中伊佐地橋	伊佐地中線	宇部市	大字東吉部	ボックスカルバート	1965	2.3	7.2	2017	I				○				
矢橋橋0784	矢橋沼田ヶ原線	宇部市	大字矢橋	RC橋	1970	6	5.3	2015	III	○					断面修復	2021	2022
下茶屋橋	下茶屋線	宇部市	大字船木	PC橋	1980	10.1	6.2	2018	II					○			
第二小坂橋	小坂線	宇部市	大字西吉部	PC橋	2007	12.2	8.2	2018	II					○			
無名橋0787	二沖茶屋線	宇部市	大字船木	ボックスカルバート	1980	3.3	5.1	2018	II					○			
無名橋0788	二沖茶屋線	宇部市	大字船木	RC橋	1969	2	4.9	2016	II			○					
土田橋	真綿川西通り2号線	宇部市	大字上宇部	鋼橋	1973	42	7	2015	III	○					断面修復	2026	2027
寿橋	宇部新川恩田線	宇部市	松島町	RC橋	1938	33	14.1	2014	III	○					断面修復	2023	2025
綿橋	綿橋通り線	宇部市	新町	RC橋	1960	48.9	8.7	2014	III	○					断面修復	2021	2023

橋梁名	路線名	所在地		橋梁の種類	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	最新点検結果		定期点検 (5箇年) (西暦)					対策内容	対策予定年度 (※着手は設計含む)	
								点検年度 (西暦)	判定区分	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年		着手予定	完了予定
真綿大橋	東海岸通り線	宇部市	新町	PC橋	1993	60.4	25.8	2018	I								
馬渡橋	馬渡橋西割線	宇部市	西沖の山	PC橋	1961	45	7	2014	III	○					断面修復	2025	2027
新琴川橋	岩鼻中野開作線	宇部市	大字藤曲	鋼橋	2017	292.5	11.8	2018	I			○					
宇内橋	上小野下宇内線	宇部市	大字小野	PC橋	1995	48.1	7	2017	II				○				
洲畑橋	中開作中野線	宇部市	大字中野開作	PC橋	1995	31.8	6	2016	II								
1号橋	床波駅漁港線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1971	37.5	6	2015	II	○							
新沢波橋(栄橋)	床波駅漁港線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1970	27.4	6	2014	III	○					断面修復	2026	2027
河原橋	下田町梅田線	宇部市	大字船木	PC橋	1970	38.6	6.5	2016	II			○					
霧田橋	霧田小野奥煙浅地線	宇部市	大字船木	PC橋	1975	46.6	8.8	2016	II			○					
福岡橋	口ノ坪今富線	宇部市	大字西万倉	鋼橋	1973	26	5	2015	III	○					断面修復	2027	2028
第二夏目橋	栄町京方線	宇部市	大字東万倉	PC橋	1972	38.9	7	2016	III	○					断面修復	2022	2023
第二夏目橋歩道橋	栄町京方線	宇部市	大字東万倉	鋼橋	1989	38.9	2.8	2018	II					○			
中川橋	東割黒石線	宇部市	大字妻崎開作	PC橋	2000	32.5	7.2	2017	II				○				
大野橋	大野線	宇部市	大字船木	RC橋	1965	40.1	4.6	2018	I					○			
江頭高架橋	岡の辻江頭線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1973	43.7	4.5	2015	III	○					断面修復	2021	2022
岡ノ辻高架橋	岡の辻新浦線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1973	38	8	2015	III	○					断面修復	2021	2022
今村跨道橋	岡の辻今村線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1973	38	4.5	2015	III	○					断面修復	2021	2021
瀬田橋	今富大河内線	宇部市	大字万倉	PC橋	1977	69.5	4.2	2017	II			○					
緑橋	緑橋芝中線	宇部市	相生町	PC橋	1977	37.9	9.3	2017	II			○					
新錦橋	新天町線	宇部市	新町	RC橋	1959	41	7.5	2014	III	○					断面修復	2027	2030
住吉橋	床波小路線	宇部市	大字西岐波	PC橋	2000	21	6	2017	II				○				
床波橋	江頭床波漁港線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1960	16	4	2016	III	○					断面修復	2028	2029
新浦橋	江頭床波漁港線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1963	15	3	2016	II			○					
土手町橋	新開作妻崎線	宇部市	大字妻崎開作	PC橋	1989	36	6.2	2018	II					○			
学校橋	厚南中学校線	宇部市	大字中野開作	PC橋	1993	31	2.5	2016	II			○					
尺田高架橋	村松北線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1941	5.7	3.1	2016	II			○					
渡瀬橋	川崎上小野線	宇部市	大字如意寺	混合橋	1951	104.5	3	2014	III	○					断面修復	2028	2030
下小野橋	下小野2号線	宇部市	大字小野	RC橋	1962	66	4.3	2018	I					○			
倉子橋	重倉下石線	宇部市	大字小野	鋼橋	2003	58.8	6.2	2018	II					○			
木田橋	木田線	宇部市	大字木田	RC橋	1939	61	4.5	2014	III	○					断面修復	2024	2026
上西山橋	梅田線	宇部市	大字東万倉	PC橋	1958	36	2	2015	III	○					断面修復	2028	2029
西山橋	船木西山線	宇部市	大字東万倉	PC橋	1986	35.3	5	2016	II			○					
第二布目橋	第一茶屋線	宇部市	大字船木	RC橋	1924	28.4	1.6	2015	III	○					断面修復	2026	2027
第一夏目橋	宮尾京方線	宇部市	大字東万倉	RC橋	1963	42	4	2016	III	○					断面修復	2026	2027
国近橋	国近口ノ坪線	宇部市	大字東万倉	鋼橋	1973	37.3	7	2016	II			○					
福岡下橋	第二福岡線	宇部市	大字西万倉	鋼橋	1972	30.1	3	2015	II	○							
正楽寺橋	土井正楽寺線	宇部市	大字西万倉	鋼橋	1972	30.1	2	2015	III	○					断面修復	2022	2023
伊佐地橋	土井伊佐地線	宇部市	大字奥万倉	鋼橋	1972	25	2	2015	II	○							
蛇瀬橋	小羽山中央線	宇部市	北小羽山四丁目	PC橋	1976	85	14.2	2018	III				○		断面修復	2029	2030
後河内橋	国近後河内線	宇部市	大字東万倉	鋼橋	1972	40	3	2016	II			○					
向井坂橋	丸尾岐波浦日ノ山線	宇部市	大字東岐波	PC橋	1974	15.7	4.7	2017	II				○				
白土第2橋	床波吉田線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1933	15.8	5.7	2016	II			○					
鎌田橋	丸山黒岩小串線	宇部市	大字中宇部	PC橋	1972	24.1	4.2	2017	II			○					
石田橋	西山線	宇部市	大字川添三丁目	PC橋	1996	21.8	10	2017	II			○					
高天原橋	中原線	宇部市	大字東須志	鋼橋	1973	43.9	5	2015	II	○							
御手洗橋	まかよ小串線	宇部市	大字中宇部	RC橋	1959	19.6	2.2	2016	II			○					
御手洗歩道橋	まかよ小串線	宇部市	大字中宇部	鋼橋	1978	20.3	2	2016	III	○					断面修復	2021	2022
川津橋	川津線	宇部市	大字中宇部	PC橋	2001	19.5	6.2	2018	I					○			
鳴水橋	真綿川南小羽山線	宇部市	大字中宇部	RC橋	1973	15.6	12.2	2017	II			○					
中川新橋	新開作線	宇部市	大字妻崎開作	PC橋	1988	36	3.3	2018	II					○			
新橋	西の宮線	宇部市	大字中宇部	PC橋	1972	22.7	2	2016	II			○					
際波橋	宇部駅小野田線	宇部市	大字際波	鋼橋	1972	21.6	8.3	2014	III	○					断面修復		
際波歩道橋	宇部駅小野田線	宇部市	大字際波	鋼橋	1995	30	2.5	2014	II	○							
長沢跨線橋	流川原線	宇部市	大字東須志	PC橋	1973	54.9	12.3	2018	II					○			
長沢第2跨線橋	流川原線	宇部市	大字東須志	RC橋	1935	16	5.3	2018	III					○	断面修復	2022	2023
竹園橋	西仙線	宇部市	大字中宇部	RC橋	1971	27.2	3.6	2015	II	○							
中野開作橋	中野開作線	宇部市	大字中野開作	PC橋	1999	30.9	10.5	2018	II					○			
無名橋6738	岡田登上梅田線	宇部市	大字東須志	鋼橋	1973	41.9	4	2014	III	○					断面修復	2025	2026
上膳原橋	第二新郷線	宇部市	大字船木	鋼橋	1975	39.2	8.4	2017	III				○		断面修復	2023	2024
下膳原橋	西見追田線	宇部市	大字船木	鋼橋	1975	45	7	2016	III			○			断面修復	2022	2023
第二福岡橋	福岡線	宇部市	大字矢橋	鋼橋	1983	16.9	4.3	2018	II					○			
黒瀬橋	櫻原線	宇部市	大字櫻原	鋼橋	1984	57.5	5.2	2016	II			○					
新東割橋	中野開作黒石目線	宇部市	大字妻崎開作	PC橋	1989	32.7	15.4	2016	II			○					
白浜橋	新浦瀬田線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1993	17.4	8.7	2017	II				○				
沢波橋	山村上の原大田線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1993	16	10.3	2018	II					○			
奥堤橋	請川王子線	宇部市	西岐波上片倉	PC橋	1990	40	11.5	2016	II			○					
奥王子橋	請川王子線	宇部市	大字東岐波	PC橋	1993	28	14.5	2015	II	○							
片倉橋	片倉線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1993	21.9	20.8	2018	II					○			
長徳橋	岩鼻中山線	宇部市	大字中山	PC橋	1995	17.5	8.6	2017	III			○			断面修復	2028	2029
権現池橋	請川王子線	宇部市	大字東岐波	RC橋	1996	32.5	7	2018	II					○			
長谷橋	黒岩片倉線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1996	32.5	14	2016	II			○					
瀬大橋	新浦瀬田線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1989	42	10.5	2016	II			○					
新権代橋	床波吉田線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1998	23.6	11.7	2018	III				○		断面修復	2028	2029
末信橋	末信郷井線	宇部市	大字末信	鋼橋	1998	111.7	10.8	2017	II				○				
月見橋	特世寺田の小野線	宇部市	大字車地	PC橋	1991	15.6	4.8	2018	II					○			
上片倉高架橋	請川王子線	宇部市	大字西岐波	RC橋	1991	84.9	12.5	2017	II					○			
宇部大橋	北琴芝鍋倉町線	宇部市	大字小串	PC橋	2001	30	28.8	2017	II			○					
多口田橋	古殿王子線	宇部市	大字東岐波	PC橋	2001	23	13.8	2018	II					○			
古殿橋	古殿王子線	宇部市	大字東岐波	PC橋	2002	21.6	13.8	2018	II					○			
黒岩橋	黒岩線	宇部市	大字上宇部	PC橋	2002	50.9	5	2017	II				○				
新江頭橋	大沢新浦線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1987	18.7	10.4	2016	II			○					
河原川開道橋(川上橋)	南側請川線	宇部市	大字西岐波	PC橋	2001	22.1	6.2	2017	II			○					
下請川橋	請川2号線	宇部市	大字西岐波	PC橋	1999	19.6	11.2	2018	II					○			
城生原橋	田の小野城生原車地線	宇部市	大字車地	PC橋	2003	18.5	6.2	2018	II					○			
新西ノ宮橋	西の宮野中線	宇部市	東小串一丁目	PC橋	2006	29.8	17.8	2018	II					○			
楠跨道橋	西見追田線	宇部市	大字船木	PC橋	2004	50.9	5	2015	II	○							
